

[☑](#), [nepublikované](#), [📄 Dokument](#), [Metodiky a související odkazy a zdroje](#), [část dokumentu](#), [📖 Znalosti EG](#), [pro správce systémů](#), [pro úřady](#), [pro IT manažery](#), [pro architekty](#), [pro aťáky](#)

Úkol



Termín: 25.10.2024

← [Ponk v EGdílňě](#)

Detailnější rozpad přípravných fází životního cyklu IS/ICT řešení


Životní cyklus ICT řešení a informačního systému má celkem 6 fází. Tyto fáze jsou určeny v § 15 vyhlášky [360/2023 Sb. \(vyhláška o dlouhodobém řízení\)](#) a následné paragrafy udávají k jednotlivým fázím podrobnosti. Pro přípravu a správnou tvorbu informačního systému či ICT řešení jsou zcela klíčové první tři fáze, které se obvykle neřeší dostatečně podrobně.

Cílem je podrobnější rozpad fází tak, abychom rozuměli, co se v jednotlivých fázích děje a jaké jsou výstupy.

První diagram zobrazuje první dvě fáze životního cyklu ICT řešení. Tyto dvě fáze jsou dost propojené a vzájemně se ovlivňují.



Druhý diagram zobrazuje třetí fázi životního cyklu ICT řešení. Tato fáze je klíčová pro vytvoření kvalitního řešení, které bude splňovat požadavky zadavatele, ale i požadavky EG legislativy. Fáze má velice složitý rozpad.

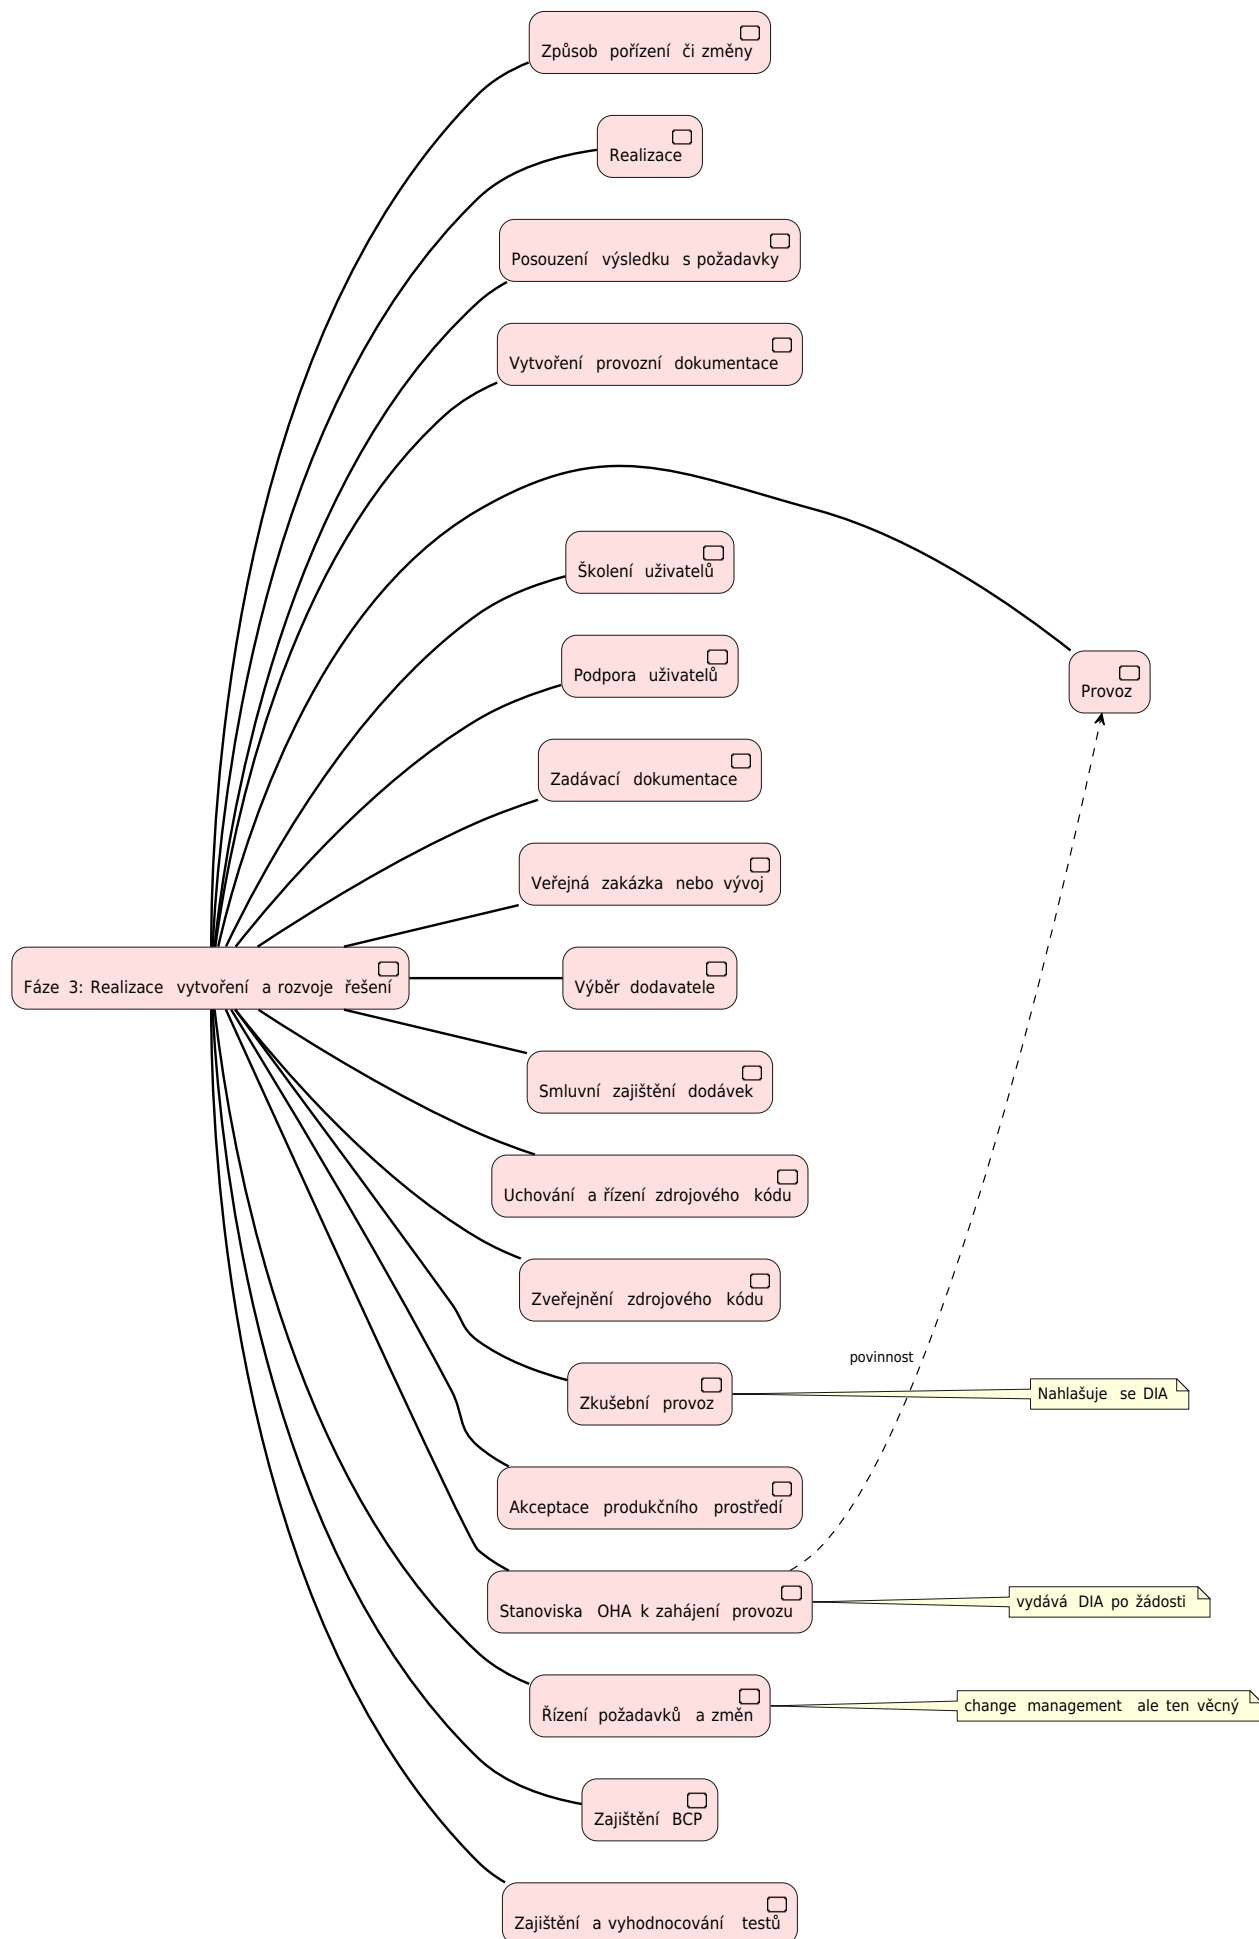

Řada věcí musí být pochopitelně jasná již z prvních dvou fází. Výstupy počátku třetí fáze jsou již určeny pro zadání a tedy musí být vystavěny na dobré architektuře, konceptu a na správně formulovaných požadavcích.

Shrnuto, je třeba nejprve:

1. Posoudit, zda a jaké řešení vlastně budu potřebovat a rámcově vědět, co bude muset umět.
2. Zanést včas příslušný záměr do svojí [informační koncepce OVS](#) a teprve pak pokračovat v přípravách.
3. Vytvořit si dokument se základním záměrem, včetně alespoň rámcové architektury a podle tohoto dokumentu dále postupovat, přičemž v případě změn rámcového zadání také tento dokument aktualizovat.
4. Co nejdřív začít připravovat formulář pro stanovisko OHA (viz [TIP: Začněte dělat formulář OHA co nejdříve](#)) a tím také samotný systém bude postupně dostávat detailnější obrysy.
5. Připravit investiční záměr a ten v OVS/OVM řádně projednat.
6. Mít seznam funkčních požadavků na příslušný systém a řešení a teprve z něj pak sestavovat zadávací dokumentaci (viz [TIP: Nejdřív požadavky a pak z nich teprve zadávací dokumentace](#)).

Hlavně je ale důležité si nastavit správně vlastní vnitřní procesy a nastavit si i správně seznam a rozsah interních dokumentů, řada z nich se totiž pak stane součástí [provozní dokumentace](#).

Rozpad prvních fází - přípravná část

From:
<https://www.egdwiki.info/> -

Permanent link:
<https://www.egdwiki.info/egdilna:ponk:pokus-o-rozpad-fazi-zivotniho-cyklu-is-ict-reseni?rev=1733214940>

Last update: 03.12.2024 09:35

